



Banedanmarks Netredegørelse 2026 – Bilag 3.5B

Bilag 3.5B

Indhold

Side

1. Fjernbanen

Oversigt over Fjernbanen

3 - 4

TIB 1 - 35

6 - 11

2. S-banen

Oversigt over S-banen

5

TIB 810 - 880

12 - 14

Fjernbanen TIB 1 – 11 + 26

Netredefølge 2026 - overblik 2027

- (Høje Taastrup) – (Roskilde)
Sporfornyelse (Høje Taastrup) – (Roskilde)
- Ringsted – Slagelse
Sporfornyelse Ringsted – Slagelse
- Sprogø – Korsør
Udskiftning af ventilatorer
- (Odense) – (Middelfart)
Ny bane over Vestfyn
- (Taulov) – (Snoghøj)
Omisolering af bro
- Nykøbing F – Nykøbing F Vest
Vordingborg – Eskilstrup
Ringsted Femern banen
- (Roskilde) – Kalundborg
Ibrugtagning af signalprogram
- København – Østerport
Afvandingsarbejder
- København H - Kastrup - Peberholm
Signalprogrammet
- (Vigerslev) – (Kalvebod)
Etablering af overhalingsspor
- (Røddekro) – Padborg
Signalprogrammet



Fjernbanen TIB 23 - 32

Netredegørelse 2026 - overblik 2027


- Aarhus H
Ombygning Aarhus H
- (Tinglev) – Sønderborg
Signalprogram
- Esbjerg st.
Perron og sporformyelse
- (Vejen) - Esbjerg st.
Ombygning samt nedrivning af bro
- (Bramming) – Holsted – (Vejen)
Perronarbejder på Holsted St.
- (Bramming) – Tjæreborg – (Esbjerg)
Perronarbejder på Tjæreborg St.
- (Esbjerg) – (Varde)
Omisolering af broer
- Holstebro st.
Broarbejder og perronarbejder



S-banen

Netredegørelse 2026 - overblik 2027

- **Valby – Høje Taastrup**
Sporfornyelse Valby – Høje Taastrup
- **Svanemøllen – Hillerød**
Afvanding/Sporskifter/Omisolering af bro
- **(Lersøen) – (Grøndal)**
Brorenovering samt renovering af Nørrebro St.

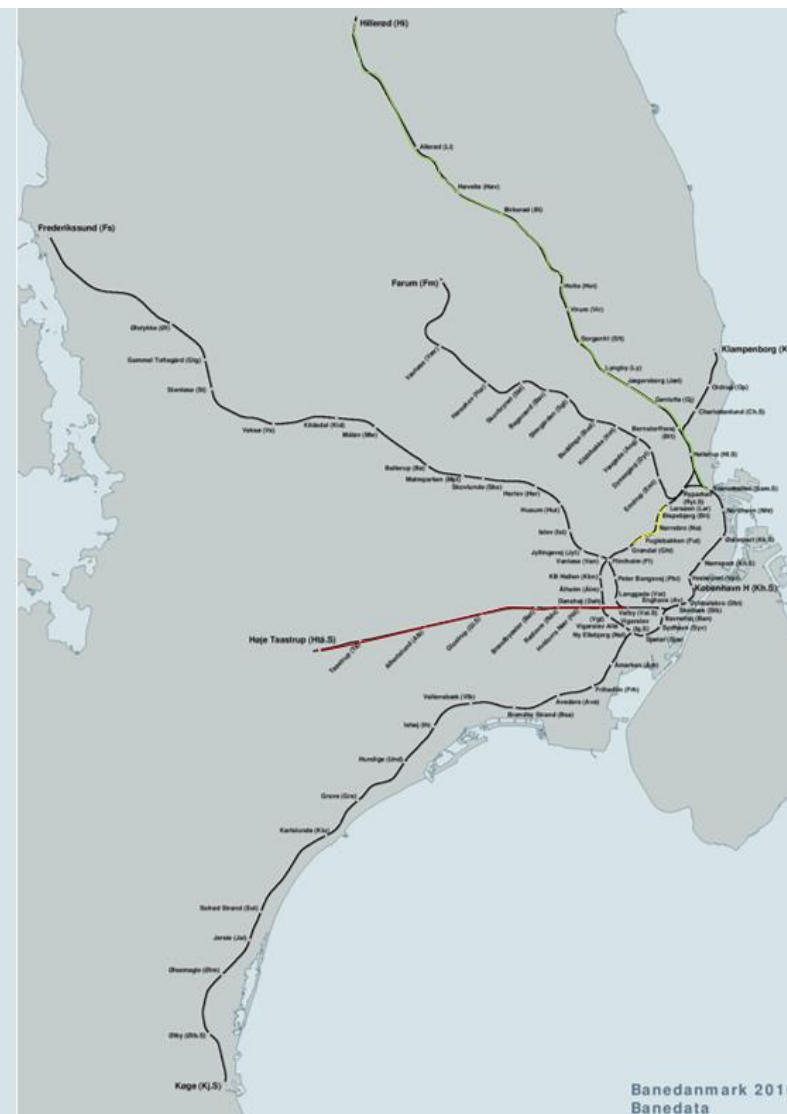

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projekt navn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
1	1	(Høje Taastrup) – (Roskilde)	(Høje Taastrup - Roskilde)	RPM-arbejde og skærmtage	65 døgn		01.03 – 05.05	Spærring af 1. hovedspor + LA80 i 2. hovedspor (max 1500 m omkring arbejdsområdet)	Banedanmark	Major
2	1	(Høje Taastrup) – (Roskilde)	(Høje Taastrup - Roskilde)	RPM-arbejde og skærmtage	56 døgn		10.04 – 05.06	Spærring af 2. hovedspor + LA80 i 1. og 3. hovedspor (max 1500 m omkring arbejdsområdet)	Banedanmark	Major
3	1	(Høje Taastrup) – (Roskilde)	(Høje Taastrup - Roskilde)	RPM-arbejde og skærmtage	60 døgn		04.06 – 03.08	Spærring af 3. hovedspor + LA80 i 2. og 4. hovedspor (max 1500 m omkring arbejdsområdet)	Banedanmark	Major
4	1	(Høje Taastrup) – (Roskilde)	(Høje Taastrup - Roskilde)	RPM-arbejde og skærmtage	72 døgn		03.08 – 14.10	Spærring af 4. hovedspor + LA80 i 3. hovedspor (max 1500 m omkring arbejdsområdet)	Banedanmark	Major
5	1	Sorø – (Slagelse)	Ringsted – Slagelse - Stadie 0a	Ny sporkasse, forberedelse til udskiftning af sporskifte 05b, justering af K-ophæng.	5 døgn og 8 timer		24.03 kl. 20:00 - 30.03 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift Dele af Sorø spor 1 spærret LA80 i nabospor	Banedanmark	Major
6	1	Ringsted - Slagelse	Ringsted – Slagelse - Stadie 0b	Ilægning af sporskifte 05b i Sorø	8 timer		27.03 kl. 20:00 - 28.03 kl. 04:00	Totalspærring Ringsted Slagelse. Mulighed for at vende tog i Ringsted og Slagelse.	Banedanmark	Major
7	1	(Ringsted) – (Fjenneslev)	Ringsted – Slagelse - Stadie 1	Nye skinner og sveller, DSM-kørsel, justering/udskiftning af K-ophæng	17 døgn og 8 timer		29.05 kl. 20:00 - 16.06 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor	Banedanmark	Major
8	1	Fjenneslev – (Ringsted)	Ringsted – Slagelse - Stadie 2	Nye skinner og sveller, DSM-kørsel, justering/udskiftning af K-ophæng	11 døgn		16.06 kl. 04:00 - 27.06 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor	Banedanmark	Major

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projekt navn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
9	1	(Sorø) – Fjenneslev	Ringsted – Slagelse - Stadie 3	Nye skinner og sveller	5 døgn		27.06 kl. 04:00 - 02.07 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor	Banedanmark	Major
10	1	Sorø st.	Ringsted – Slagelse - Stadie 4	Dræn, brønde, udveksling af sporskifte 03b, kørestrømsarbejde	11 døgn		02.07 kl. 04:00 - 13.07 kl. 04:00	Sorø spor 3 spærret Kun drift i spor 1 og 2	Banedanmark	Major
11	1	(Slagelse) – (Sorø)	Ringsted – Slagelse - Stadie 5	Ilægning af sporskifte 05a, justering af K-ophæng, broarbejder	4 døgn og 16 timer		13.07 kl. 04:00 - 17.07 kl. 20:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor	Banedanmark	Major
12	1	Ringsted – Slagelse	Ringsted – Slagelse - Stadie 6	Grøft- og drænarbejde, udskiftning af sporskifter, bro- og kørestrømsarbejde	8 døgn og 8 timer		17.07 kl. 20:00 - 26.07 kl. 04:00	Totalspærring Ringsted Slagelse. Mulighed for at vende tog i Ringsted og Slagelse.	Banedanmark	Major
13	1	Sorø	Ringsted – Slagelse - Stadie 7	Grøft- og drænarbejde, ny sporkasse, skinner og sveller, bro- og kørestrømsarbejde	21 døgn		26.07 kl. 04:00 - 16.08 kl. 04:00	Kun drift i spor 3 på Sorø st. Spor 1 og 2 spærret ved perron.	Banedanmark	Major
14	1	Ringsted – (Fjenneslev)	Ringsted – Slagelse	RPM-arbejde. Ny sporkasse	10 døgn og 4 timer		06.09 kl. 22:00 - 17.09 kl. 02:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor La40 i nabospor maks. 400 meter	Banedanmark	Major
15	1	(Sorø) – Ringsted	Ringsted – Slagelse	RPM-arbejde Ny sporkasse	7 døgn		17.09 kl. 02:00 - 24.09 kl. 02:00	Enkeltsporsdrift Sorø-Fjenneslev - Ringsted Hele Fjenneslev spor 2 spærret – der skal køres enkeltsporsdrift mellem Ringsted og Sorø. LA80 i spor 1 Fjenneslev	Banedanmark	Major
16	1	(Fjenneslev) - Sorø	Ringsted – Slagelse	RPM-arbejde Ny sporkasse	9 døgn		24.09 kl. 02:00 - 03.10 kl. 02:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor La40 i nabospor maks. 400 meter	Banedanmark	Major
17	1	Sorø – Slagelse	Ringsted – Slagelse	RPM-arbejde Ny sporkasse	10 døgn		03.10 kl. 02:00 - 13.10 kl. 02:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor	Banedanmark	Major

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projekt navn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
								La40 i nabospor maks. 400 meter		
18	1	Fjenneslev – Ringsted	Ringsted – Slagelse	RPM-arbejde Ny sporkasse	11 døgn		13.10 kl. 02:00 – 24.10 kl. 02:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor La40 i nabospor maks. 400 meter	Banedanmark	Major
19	1	Sorø – Fjenneslev	Ringsted – Slagelse	RPM-arbejde Ny sporkasse	7 døgn		24.10 kl. 02:00 – 01.11 kl. 02:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor La40 i nabospor maks. 400 meter	Banedanmark	Major
20	1	Slagelse – Sorø	Ringsted – Slagelse	RPM-arbejde Ny sporkasse	15 døgn og 2 timer		01.11 kl. 02:00 – 15.11 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor La40 i nabospor maks. 400 meter	Banedanmark	Major
21	1	Korsør	Vedligeholdelsesarbejde	Køreledningsvedligehold mellem spor 2 og 3	6 timer		21.03 – 22.03	Totalspærring 6 timer	Sund og Bælt	Minor
22	1	Sprogø	Vedligeholdelsesarbejde	Køreledningsvedligehold mellem spor 1 og 2	6 timer	April		Totalspærring 6 timer	Sund og Bælt	Minor
23	1	Nyborg	Vedligeholdelsesarbejde	Køreledningsvedligehold mellem spor 2 og 3	6 timer		14.11 – 15.11	Totalspærring 6 timer	Sund og Bælt	Minor
24	1	Sprogø - Nyborg	Udskiftning af lejer på Vestbroen	Broarbejde	7 måneder med 2 timer pr uge		01.04 – 31.10	Totalspærring i 2 timer en nat hver uge for udskiftning af brolejer. Arbejdet skal foregå på natten imellem søndag og mandag (nat 1)	Sund og Bælt	Minor
25	1	Sprogø - Korsør	Udskiftning af ventilatorer	Tunnelarbejde	14 døgn		16.05 – 30.05	Enkeltsporsdrift. 1. hovedspor spærret Sprogø-Korsør	Sund og Bælt	High
26	1	Sprogø - Korsør	Udskiftning af ventilatorer	Tunnelarbejde	14 døgn		13.06 – 27.06	Spærring af 2. hovedspor Sprogø-Korsør.	Sund og Bælt	High
27	1	(Odense) – (Middelfart)	Ny bane Vestfyn	Sporskifte- og kørestrømsarbejder	5 døgn	Q3/Q4		Totalspærring Ingen tog mellem Odense og Middelfart	Vejdirektoratet/ Banedanmark	Medium

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projekt navn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
28	1	Kavslunde	Ny Bane over Vestfyn	Skinneleverancer Svelleleverancer	106 døgn og 21 timer		26.07 kl. 02:00 - 08.11 kl. 23:00	Ved enkeltsporsdrift til/fra Kavslunde skal der ind/udrangeres	Vejdirektoratet/ Banedanmark	Major
29	1	(Taulov) - (Snoghøj)	Omisolering af Bro	Omisolering 26430	22 døgn		03.07 - 24.07	Enkeltsporsdrift Taulov-Snoghøj	Banedanmark	Major
30	1	(Snoghøj) - (Taulov)	Omisolering af Bro	Omisolering 26430	22 døgn		25.07 - 15.08	Enkeltsporsdrift Snoghøj-Taulov	Banedanmark	Major
31	2	Nykøbing F-Nykøbing F Vest	Ringsted Femern banen	Ibrugtagning af ny Kong Frederik IX's bro	7 døgn		03.12 kl. 20:00 - 10.12 kl. 20:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
32	2	Vordingborg-Eskilstrup	Ringsted Femern banen	Ibrugtagning af nyt østlige spor på den nye Storstrømsbro	3 døgn og 3 timer		15.05 kl. 01:00 - 18.05 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
33	5	(Roskilde)-Kalundborg	Ibrugtagning af signalprogram	Ibrugtagning af signalprogram	4 uger		13.11 - 11.12	Totalspærring	Banedanmark	Major
34	10	København-Østerport	Afvandingsarbejder	Afvandingsarbejder	2 døgn og 4 timer og 40 minutter		05.02 kl. 23:40 - 08.02 kl. 04:20	Totalspærring Kh-Kk-Kh begge hovedspor Der vil være mulighed for at åbne 2.hsp for DSB ca. hver 6 time for placering af materiel.	Banedanmark	Medium
35	11	(København)-Kastrup-Peberholm	Ibrugtagning af signalprogram	Ibrugtagning af signalprogram	7 døgn		22.03 - 29.03	Totalspærring	Banedanmark	High
36	11	Vigerslev - Kalvebod	Etablering af overhalingsspor	Sporarbejder	14 døgn	Q1/Q2		Spærring af 1. hovedspor	Sund & Bælt	High
37	11	Vigerslev - Kalvebod	Etablering af overhalingsspor	Sporarbejder	8 døgn	Q2/Q3		Totalspærring	Sund & Bælt	High
38	11	Vigerslev - Kalvebod	Etablering af overhalingsspor	Sporarbejder	8 døgn	Q2/Q3		Totalspærring	Sund & Bælt	High

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projekt navn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
39	11	Vigerslev – Kalvebod	Etablering af overhalingsspor	Sporarbejder og kørestrøms arbejder	3 døgn og 4 timer	Q2/Q3		Totalspærring	Sund & Bælt	Medium
40	11	Vigerslev – Kalvebod	Etablering af overhalingsspor	Spor og Kørestrøms arbejder	14 døgn	Q3/Q4		Spærring af 1. hovedspor	Sund & Bælt	Minor
41	11	Vigerslev – Kalvebod	Etablering af Overhalingsspor	Kørestrøms arbejder	3 døgn og 4 timer	Q3/Q4		Totalspærring	Sund & Bælt	Medium
42	23 + 24	Aarhus H	Ombygning Aarhus H	Sporarbejder			Fortsættelse fra K26, 13.12.26 - 26.06 kl. 24:00	Spærring af spor 2+3, alle tog kan gennemføres uden at aflyse tog. Der tillades ikke parkering på Aarhus H ved perron.	Banedanmark	Major
43	26	(Røde kro) - Padborg	Signalprogram	Ibrugtagning	9 døgn		20.03 - 29.03	Totalspærring Ingen tog imellem Røde kro og Padborg. Gælder også tog fra Tyskland til Padborg.	Banedanmark	High
44	28	(Tinglev) - Sønderborg	Signalprogram	Ibrugtagning	16 døgn		14.03 - 29.03	Totalspærring af Sønderborgbanen	Banedanmark	High
45	29	Esbjerg	Esbjerg	Perron og sporfornyelse	37 døgn og 4 timer		20.08 kl. 20:00 - 27.09 kl. 00:00	Spærring af spor 2, 3, 4, 5 Tog benytter spor 0 og 1	Banedanmark	Major
46	29	Esbjerg	Esbjerg	Perron og sporfornyelse	28 døgn		27.09 - 25.10	Spærring af spor 3, 4, 5 Tog benytter spor 0, 1 og 2	Banedanmark	Major
47	29	Esbjerg	Esbjerg	Perron og sporfornyelse	10 døgn og 6 timer		25.10 kl. 00:00 - 05.11 kl. 06:00	Spærring af spor 1	Banedanmark	Major
48	29	(Bramming) - Holsted - (Vejen)	Perronarbejder på Holsted station	Perronarbejder på Holsted station Omisolering/nedrivning af broer	37 døgn og 4 timer		20.08 kl. 20:00 - 27.09 kl. 00:00	Enkeltsporsdrift Bramming-Holsted-Vejen. Ingen krydsning i Holsted.	Banedanmark	Major
49	29	(Vejen) - Holsted (Bramming)	Perronarbejder på Holsted station	Perronarbejder på Holsted station	28 døgn		27.09 - 25.10	Enkeltsporsdrift Vejen-Holsted-Bramming. Ingen krydsning i Holsted.	Banedanmark	Major

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projekt navn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
				Omisolering/nedrivning af broer						
50	29	(Bramming) - Tjæreborg - (Esbjerg)	Perronarbejde på Tjæreborg station	Perronarbejde på Tjæreborg station	37 døgn og 4 timer		20.08 kl. 20:00 - 27.09 kl. 00:00	Enkeltsporsdrift Bramming-Tjæreborg-Esbjerg	Banedanmark	Major
51	29	(Esbjerg) - Tjæreborg - (Bramming)	Perronarbejde på Tjæreborg station	Perronarbejde på Tjæreborg station	28 døgn		27.09 - 25.10	Enkeltsporsdrift Esbjerg-Tjæreborg-Bramming	Banedanmark	Major
52	29	(Vejen) - Esbjerg	Esbjerg station	Ombygning af sporskifter i Esbjerg samt nedrivning af bro	2 døgn og 8 timer		20.08 kl. 20:00 - 23.08 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
53	29	(Vejen) - (Holsted)	Bro arbejder	Nedrivning af bro	2 døgn og 8 timer		22.10 kl. 20:00 - 25.10 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
54	31	(Esbjerg) - (Varde)	Omisolering af broer	Omisolering af broer 23702, 23722, 23730	23 døgn		04.09 - 26.09	Totalspærring	Banedanmark	High
55	32	Bjerringbro	Sikkerhed på Bjerringbro station	Broarbejder og perronarbejde	55 døgn		01.05 - 24.06	Spærring af spor 2	Banedanmark	High
56	32	Bjerringbro	Sikkerhed på Bjerringbro station	Broarbejder og perronarbejde	14 døgn		25.06 - 08.07	Spærring af spor 1	Banedanmark	High
57	32	Bjerringbro	Sikkerhed på Bjerringbro station	Broarbejder og perronarbejde	3 døgn		09.07 - 11.047	Totalspærring	Banedanmark	High
58	32	Bjerringbro	Sikkerhed på Bjerringbro station	Broarbejder og perronarbejde	14 døgn		12.07 - 25.07	Spærring af spor 1	Banedanmark	High

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projekt navn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategori jf. Annex VII
59	810	(Glostrup) – Høje Taastrup	Sporfornyelse Valby – Høje Taastrup	Forberedende arbejder/afvanding på Taastrup station Udskiftning af duobloksveller på Albertslund Arbejde på sporfletningsbroen i Glostrup	3 – 5 uger		15.02 – 19.03	Enkeltsporsspærring Glostruo – Taastrup – Høje Taastrup og Høje Taastrup – Taastrup – Glostrup	Banedanmark	Major
60	810	(Albertslund) – Høje Taastrup	Sporfornyelse Valby – Høje Taastrup	Taastrup St. sporskifter/ny sporkasse/Nye skinner og sveller. SP-ibrugtagning	9 døgn		20.03 – 29.03	Totalspærring Albertslund – Høje Taastrup Adgang til DSB-værksted lukket.	Banedanmark	Major
61	810	(Taastrup) – Høje Taastrup	Sporfornyelse Valby – Høje Taastrup–	Høje Taastrup St. sporskifter/ny sporkasse/Nye skinner og sveller.	30 døgn		28.03 – 26.04	Begge spor spærret Taastrup – Høje Taastrup inkl. Høje Taastrup	Banedanmark	Major
62	810	Valby – Glostrup	Sporfornyelse Valby – Høje Taastrup	Forberedende arbejder/afvanding på Glostrup og Valby Udskiftning af duobloksveller på Bøt og Hit Omisolering perrontunnel under spor 4 Brøndbyøster	4 – 6 uger		26.04 – 17.06	Enkeltsporsspærring Valby – Glostrup	Banedanmark	Major

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projekt navn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
63	810 og 830	Valby – Peter Bangsvej	Sporfornyelse Valby – Høje Taastrup	Valby st. spor 4 & 5. Div. sporarbejder, samt omisolering af perrontunnel	23 døgn		18.06 – 10.07	Totalspærret Valby – Peter Bangs Vej S-tog mod Høje Taastrup kører igennem spor 3 i Valby	Banedanmark	Major
64	810	Valby – Glostrup – Taastrup	Sporfornyelse Valby – Høje Taastrup	Forberedende arbejder til omisoleringerne v. Vigerslevvej og Vestmotorvejen	13 døgn		28.06 – 10.07	Enkeltsporsdrift Valby – Glostrup – Taastrup Krydsning ikke mulig i Glostrup	Banedanmark	Major
65	810 og 830	Valby – Høje Taastrup Valby – Peter Bangsvej	Sporfornyelse Valby – Høje Taastrup	Sporarbejder/sporskifter på Glostrup og Valby. Perronrenovering Valby spor 3 Omisolering af broer Vestmotorvejen, Vigerslevvej og Vejle Å SP-ibrugtagning	14 døgn		11.07 – 25.07	Totalspærret Carlsberg – Høje Taastrup og Valby – Peter Bangs Vej	Banedanmark	Major
66	810 og 830	Valby – Peter Bangsvej	Sporfornyelse Valby – Vanløse	Perronrenovering Valby spor 4 og 5	30 døgn	Sommer		Totalspærret Valby – Peter Bangs Vej S-tog mod Høje Taastrup kører igennem spor 3	Banedanmark	Major
67	820	Svanemøllen – Hillerød	Hillerød st./ NFSP05762	Afvanding/sporskifter/sk inne- og svelleudveksling/omisolering af bro Hammerholtsvej Kørestømsfundamenter /master m.m.	21 døgn		5/6 – 25/6	Hillerød spor 1, 2, 1a, 1b spærret	Banedanmark	High
68	820	Svanemøllen – Hillerød	Hillerød st./ NFSP05762	Afvanding/sporskifter/ny sporkasse Skinne- og svelleudveksling Nyt kørestømsanlæg	30 døgn		25/6 – 25/7	Totalspærring Fvt – Hi begge spor	Banedanmark	High

Lb. nr.	TIB	Strækning	Projekt navn/PSP-nr.	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
				Omisolering af bro Hammerholtsvej SP-ibrugtagning						
69	820	Svanemøllen – Hillerød	Hillerød st./ NFSP05762	Afvanding/sporskifter/ny sporkasse/skinne- og svelleudveksling	40 døgn		25/7 – 3/9	Hillerød spor 3, 4, 5, 6, 7, 9 spærret. 2. hsp. Hi-Li hver aften kl. 20.30 – 04.30	Banedanmark	Major
70	880	(Lersøen) – (Grøndal)	Brorenovering Nørrebrogade og Bispengbuen samt renovering af Nørrebro st.	Omisolering og stationsrenovering	31 døgn	Sommer		Totalspærret Lersøen – Grøndal	Banedanmark og DSB	Major
71	606 608	Gribskovbanen Lille Nord	Hillerød st./ NFSP05762	Nedrivning af perron mellem spor 14 og spor 0. Diverse sporarbejder/sporskifter	40 døgn	Januar - marts		Spor 0, 14 og 15 spærres ved perron. Lokaltog benytter spor 16 og 4	Banedanmark	High
72	604	Frederiksværk banen	Hillerød st./ NFSP05762	Gennemførelse af spor 11 og 12. Omisolering af bro Hammerholtsvej Diverse sporarbejder/sporskifter SP-ibrugtagning	10 døgn	Marts	20/3 – 29/3	Favrholm - Hillerød og spor 11 og 12 spærres. Adgang til værksted spærret. Godstog aflyses. 2. hsp. Hi-Li hver aften kl. 20.30 – 04.30	Banedanmark	High
73	606 608	Gribskovbanen Lille Nord	Hillerød st./ NFSP05762	Sporarbejder/sporskifter	35 døgn		29/3 – 2/5	Totalspærring Hillerød st. mod nord. Adgang fra nord til værksted via spsk. 159b Godstog aflyses.	Banedanmark	Major
74	606 608 604	Gribskovbanen Lille Nord Frederiksværk banen	Hillerød st./ NFSP05762	Sporarbejder/sporskifter /sporstopper	40 døgn	Maj / Juni		Spor 16, 4 og 5 spærres. Drift i gennemgående spor 11 og 12 og fuld adgang til værksted. 2. hsp. Hi-Li hver aften kl. 20.30 – 04.30	Banedanmark	High
